

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

5.8 Défense incendie



PLU arrêté le : 20 novembre 2024

PLU approuvé le :

Alpicité
Urbanisme, Paysage,
Environnement

SARL Alpicité
Av. de La Clapière – 01 Rés. La Croisée des chemins
05 200 EMBRUN
Tél : 04.92.46.51.80
contact@alpicite.fr
www.alpicite.fr



DEFENSE INCENDIE VERIFICATION DES HYDRANTS

VAUJANY

Exercice 2020

Sommaire

1. LA SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE.....	1
2. LES FICHES DE VIE DES HYDRANTS	40
3. TRAVAUX A EFFECTUER SUR LES HYDRANTS.....	21

Nombre total d'hydrant sur la commune : 40

	Nombre d'intervention	Nombre d'hydrant concerné
Nombre de vérification d'hydrant dans l'année	40	40



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

1. LA SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE

N°	Diamètre / Marque / Modèle	Adresse	Date mesure	Pression statique en Bar	Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	Débit requis (1)
1	100 / Bayard / Emeraude	Parking du Collet	22 oct. 2020	0,3	53	0	Non
2	100 / Bayard / Emeraude	La Villette Fond de l'Impasse	22 oct. 2020	5,3	63	0,6	Oui
3	100 / Bayard / Emeraude	La Villette	22 oct. 2020	7,0	100	4,0	Oui
4	100 / Bayard / Emeraude	La Villette	22 oct. 2020	7,1	100	4,1	Oui
5	100 / Bayard / Emeraude	A Côté du Garage en Bois	22 oct. 2020	3,9	90	2,0	Oui
6	100 / Bayard / Emeraude	Entrée de l'Immeuble	22 oct. 2020	5,8	86	3,0	Oui
7	100 / Bayard / Emeraude	A droite des WC Public	22 oct. 2020	5,8	100	3,9	Oui
8	100 / Bayard / Emeraude	Derrière le N°16 en Direction de la Place Fare	22 oct. 2020	6,0	84	3,2	Oui
9	100 / Bayard / Emeraude	Angle Rue de Carroux	22 oct. 2020	7,6	112	5,2	Oui
10	100 / Bayard / Emeraude	Parking Résidence Le Grenier de Germaine	22 oct. 2020	5,6	194	4,8	Oui
11	100 / Bayard / Emeraude	Face au Restaurant La Table de la Fare	23 oct. 2020	7,8	158	6,7	Oui
12	100 / Bayard / Emeraude	Garderie devant le Bat Pôle Enfance	23 oct. 2020	12,7	95	7,9	Oui
13	100 / Bayard / Emeraude	Face à l'Hôtel des Cimes	23 oct. 2020	6,8	139	2,8	Oui
14	100 / Bayard / Emeraude	Dans le Virage	23 oct. 2020	8,2	152	6,2	Oui
15	100 / Bayard / Emeraude	Face au N°22 à Côté du Chalet Noisette	23 oct. 2020	9,6	160	7,5	Oui
16	100 / Bayard / Emeraude	Face à la Mairie - Accès Route des Combes	23 oct. 2020	9,0	142	6,7	Oui
17	100 / Bayard / Emeraude	Carrefour Route de la Drayre	23 oct. 2020	11,2	110	7,3	Oui
18	100 / Bayard / Emeraude	Face à la Piscine	23 oct. 2020	7,2	102	5,6	Oui
19	100 / Bayard / Emeraude	Face à l'Eglise	23 oct. 2020	10,0	75	3,3	Oui
20	100 / Bayard / Emeraude	Le Perrier Ancien Réservoir Angle Chemin du Crêt	02 nov. 2020	3,4	101	2,5	Oui
21	100 / Bayard / Emeraude	Le Perrier dans escalier N°289 Rte Col du Sabot	02 nov. 2020	6,1	110	4,7	Oui
22	100 / Bayard / Emeraude	Le Perrier	02 nov. 2020	2,8	115	1,8	Oui



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

N°	Diamètre / Marque / Modèle	Adresse	Date mesure	Pression statique en Bar	Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	Débit requis (1)
23	100 / Bayard / Emeraude	Pourchery Chapelle St Claude	02 nov. 2020	6,8	24	0	Non
24	100 / Bayard / Emeraude	Pourchery Chemin Accès à l'Auberge du Lac	02 nov. 2020	8,0	24	0	Non
25	100 / Bayard / Emeraude	Pourchery Direction Terrain de Basket	02 nov. 2020	5,0	92	1,7	Oui
26	100 / Bayard / Emeraude	Condamine Angle Route accès au Hameau	02 nov. 2020	5,3	23	0	Non
27	100 / Bayard / Emeraude	Rte du Hameau au bout de la Rte des Escaliers	02 nov. 2020	7,7	100	2,9	Oui
28	100 / Bayard / Emeraude	Rif Jany Angle de Rue	02 nov. 2020	4,2	24	0	Non
29	100 / Bayard / Emeraude	Rif Jany Début de la Rue - Accès Parking Bus	02 nov. 2020	6,3	108	4,8	Oui
30	100 / Bayard / Emeraude	Le Verney - Proche Abris Bus	02 nov. 2020	4,4	25	0	Non
31	100 / Bayard / Emeraude	Le Verney Cité EDF à côté du Transfo	02 nov. 2020	7,6	90	4,4	Oui
32	80 / Bayard / Emeraude	Le Perrier Parking Chalet Maitreray Face au N°289	04 nov. 2020	7,3	52	0	Oui
33	100 / Bayard / Emeraude	Rondpoint Rte des Combes et Rte de la Drayre	04 nov. 2020	8,0	134	6,8	Oui
39	80 / Bayard / Emeraude	Verney Chemin qui rejoint la Rue de l'Ecole	02 nov. 2020	6,2	15	0	Non
40	80 / Bayard / Emeraude	Le Rochas	04 nov. 2020	3,3	14	0	Non
41	100 / Bayard / Saphir	Hameau Le Rochas Centre Technique Communal	04 nov. 2020	3,9	80	1,8	Oui
42	100 / Bayard / Emeraude	La Villette Accès au N°641	03 nov. 2020	5,5	84	2,9	Oui
43	100 / Bayard / Emeraude	Devant la Résidence Les Epinettes	04 nov. 2020	8,7	133	6,7	Oui
44	100 / Bayard / Emeraude	Au Pied du Chemin des Pavés	04 nov. 2020	6,2	64	0,2	Oui
46	100 / Bayard / Emeraude	Montfrais	03 nov. 2020	9.5	21	0	Non

(1) SAUR évalue qu'un poteau d'incendie est capable de délivrer le débit requis suivant le critère ci-dessous. Seul le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) est habilité à déclarer un hydrant conforme.

Débit requis pour : DN 80 : > 30 m3/h DN 100 : > 60 m3/h DN 150 : > 120 m3/h

2. LES FICHES DE VIE DES HYDRANTS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 01

Adresse : VAUJANY

Parking du Collet

RGF93 X : 943035,3 Y : 6456886,7

Lat. : 45,16842 Long : 6,09432


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 09 :22		
Pression statique	0,3		
Débit maxi mesuré en m3/h	53		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

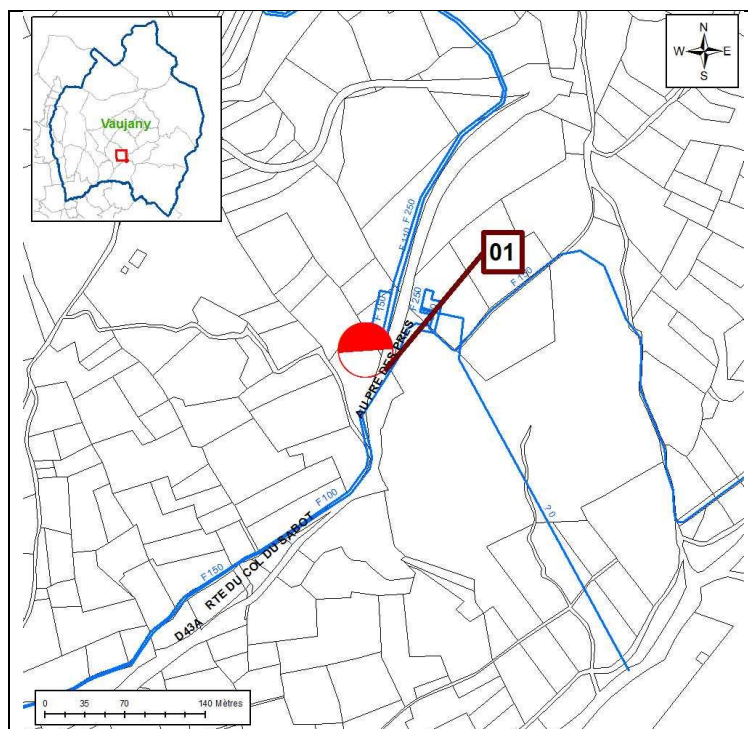

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	2 capots HS + débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 02

Adresse : VAUJANY

La Villette Fond de l'Impasse

RGF93 X: 942574,5 Y: 6456505,2

Lat. : 45,16515 Long : 6,08827


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 09 :43		
Pression statique	5,3		
Débit maxi mesuré en m3/h	63		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0,6		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Etanchéité de la tête à reprendre

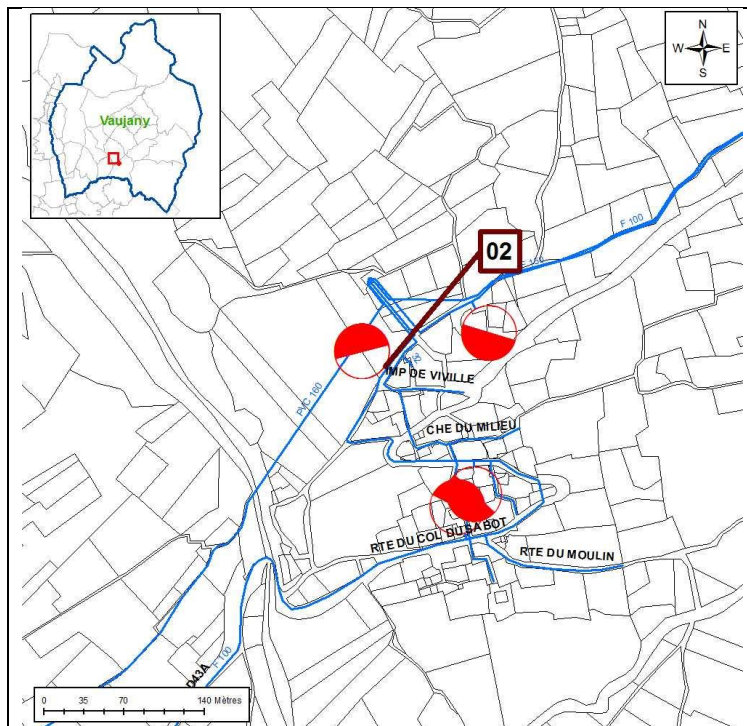

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Fuite sur joint torique tête de poteau

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 03

Adresse : VAUJANY

La Villette

RGF93 X : 942652,7 Y : 6456417,1

Lat. : 45,16433 Long : 6,08922


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 10 :30		
Pression statique	7		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	100		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	4		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

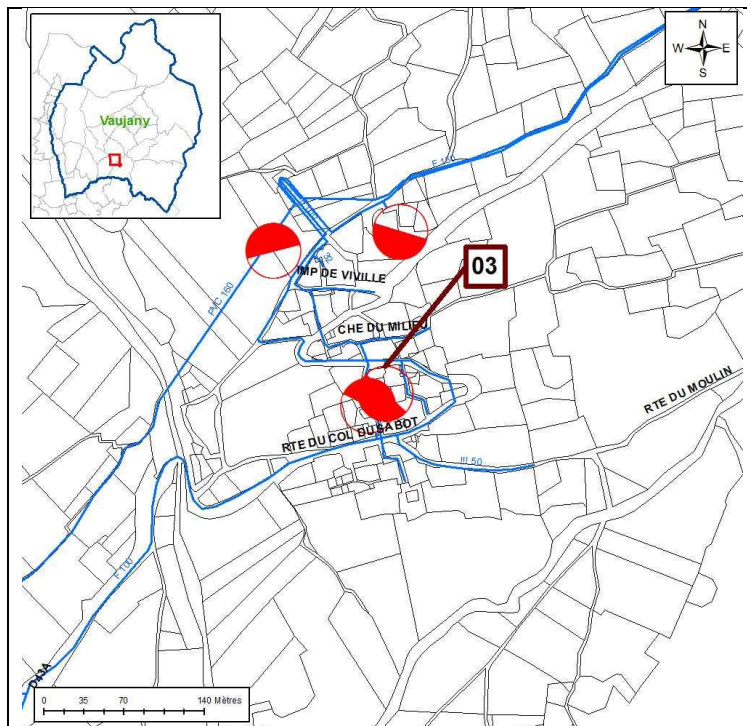

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 04

Adresse : VAUJANY

La Villette


RGF93 X : 942646,3 Y : 6456357,9 Lat. : 45,1638 Long : 6,08911

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	22/10/2020 10 :46		
Pression statique	7,1		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	100		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	4,1		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

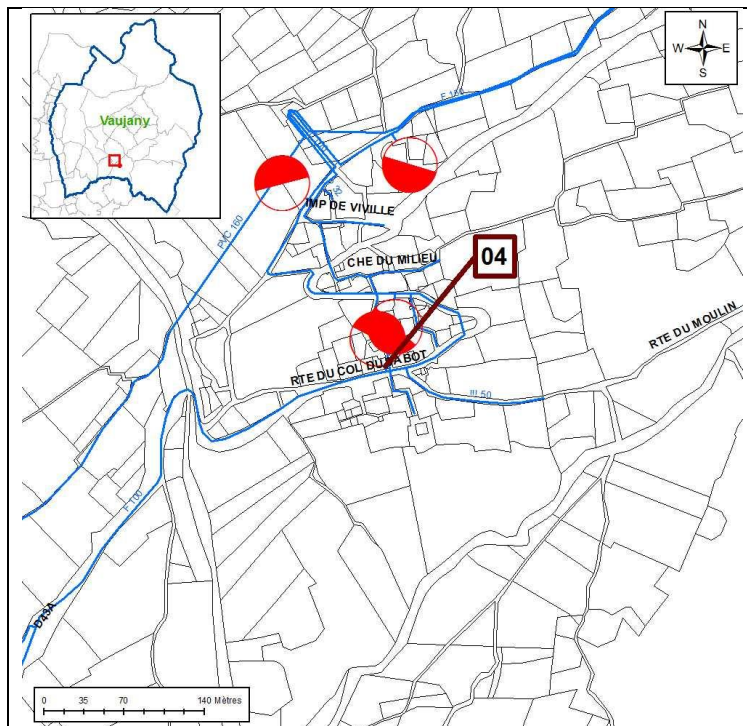

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 05

Adresse : VAUJANY

A Côté du Garage en Bois

RGF93 X : 942000 Y : 6455915,9

Lat. : 45,16005 Long : 6,08067


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 14 :05		
Pression statique	3,9		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	90		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

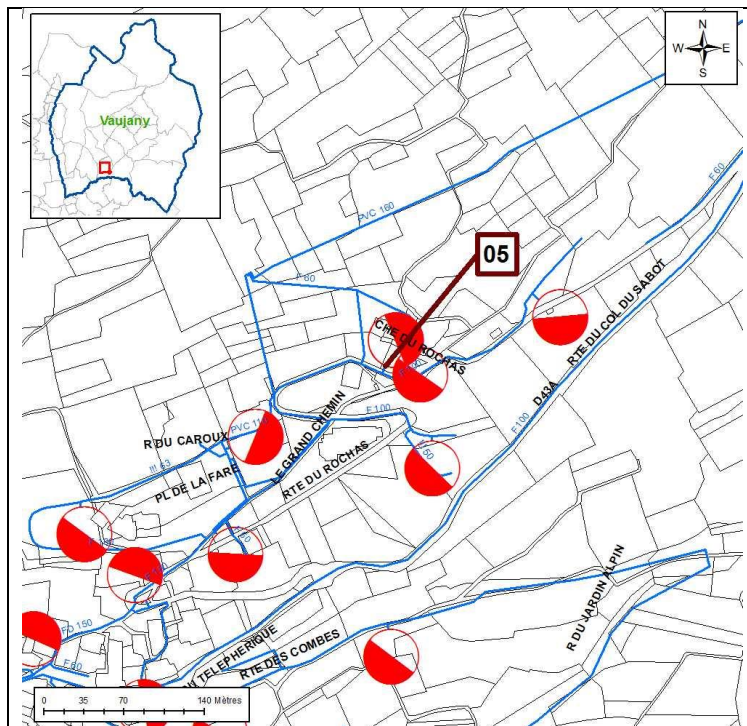

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 06

Adresse : VAUJANY

Entrée de l'immeuble

RGF93 X : 942044,8 Y : 6455854,3

Lat. : 45,15948 Long : 6,08121


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 14 :18		
Pression statique	5,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	86		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture

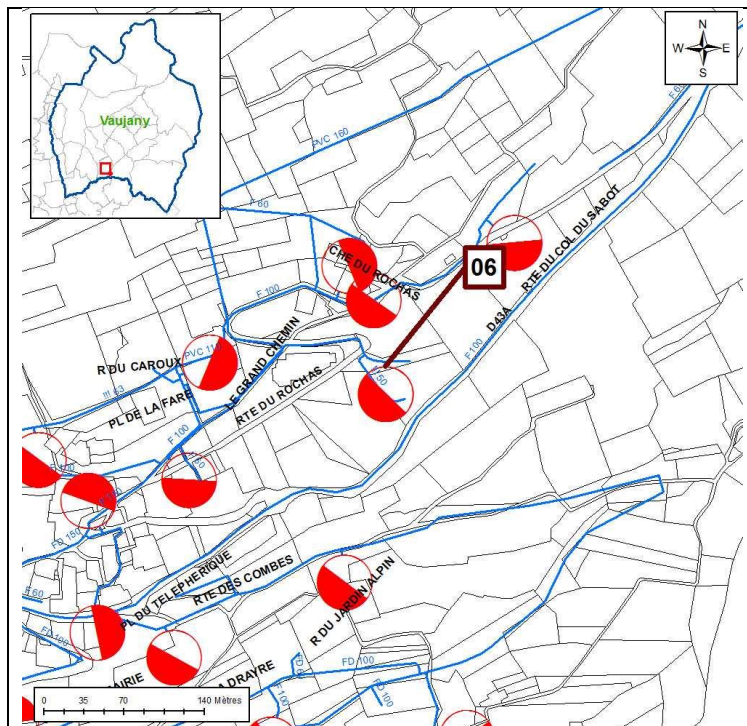

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Graffiti sur capot,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 07

Adresse : VAUJANY

A droite des WC Public

RGF93 X : 941869,1 Y : 6455844,1

Lat. : 45,15945 Long : 6,07897


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 14 :30		
Pression statique	5,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	100		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	3,9		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

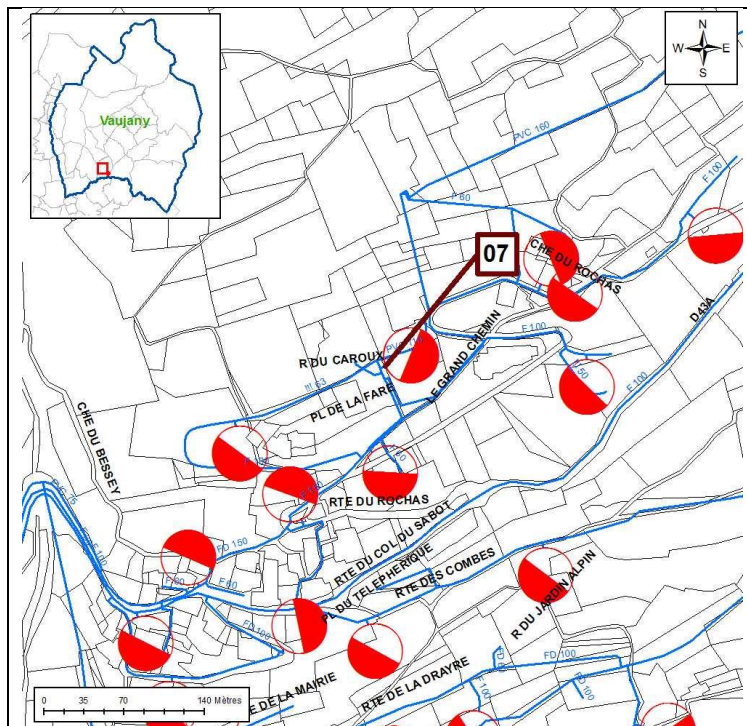

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 08

Adresse : VAUJANY

Derrière le N°16 en Direction de la Place Fare

RGF93 X : 941733,3 Y : 6455796,6

Lat. : 45,15907 Long : 6,07722


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	22/10/2020 14 :48		
Pression statique	6		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	84		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	3,2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Joint de bouchon de 65 à changer

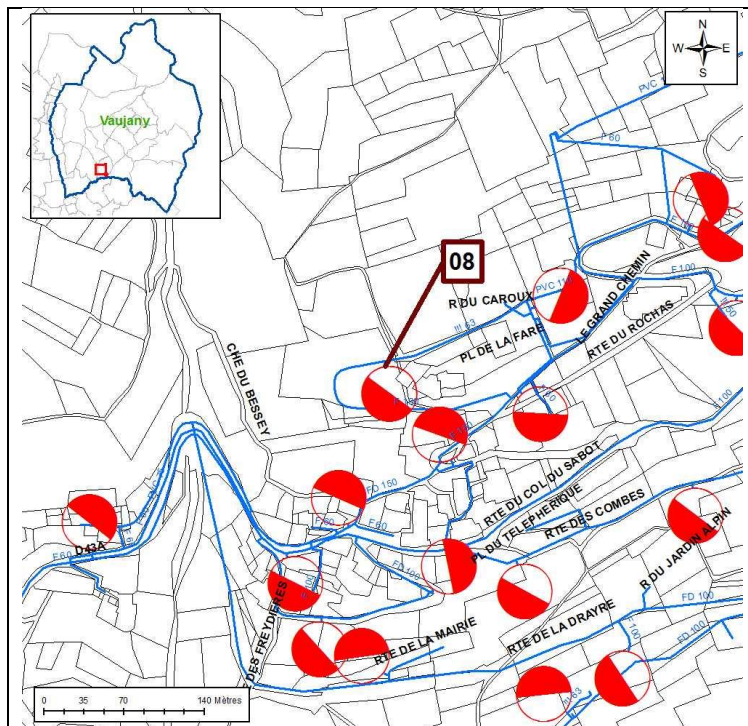

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Joint de bouchon DN 65 à changer,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 09

Adresse : VAUJANY

Angle Rue de Carroux

RGF93 X : 941853,2 Y : 6455767,9


Lat. : 45,15877 Long : 6,07873

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	22/10/2020 15 :02		
Pression statique	7,6		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	112		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	5,2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

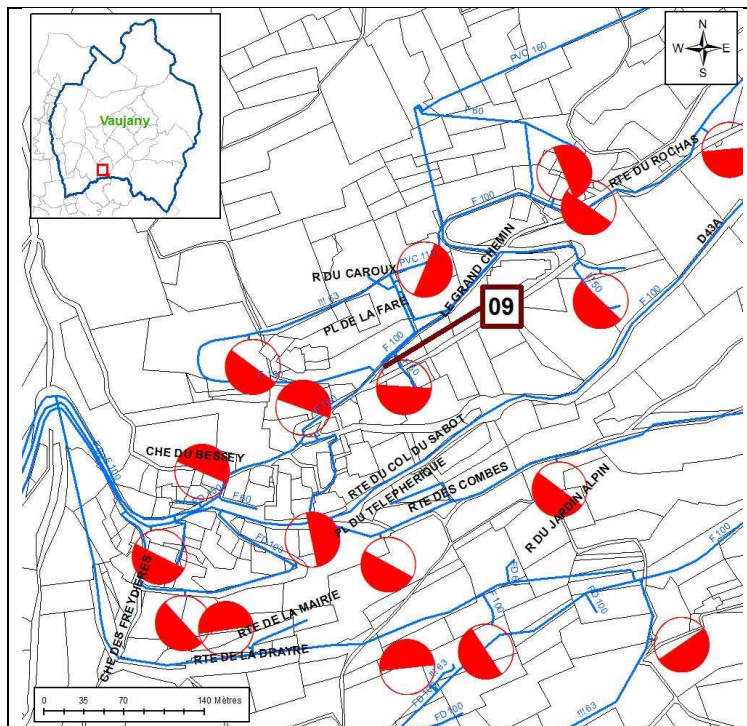

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 10

Adresse : VAUJANY

Parking Résidence Le Grenier de Germaine

RGF93 X : 941795,6 Y : 6455713,4 Lat. : 45,1583 Long : 6,07797

Caractéristiques :

Nature :	Poteau d'incendie
Marque / Modèle :	Bayard / Emeraude
Diamètre :	100
Date pose :	01/01/2013
Diamètre/Nature canalisation :	100 / Fonte

Mesures

22/10/2020

15 : 13

Pression statique

5,6

Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	
------------------------------------	--

194

Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h

4,8


Débit requis

Oui

En service

Oui

Travaux à réaliser : 0

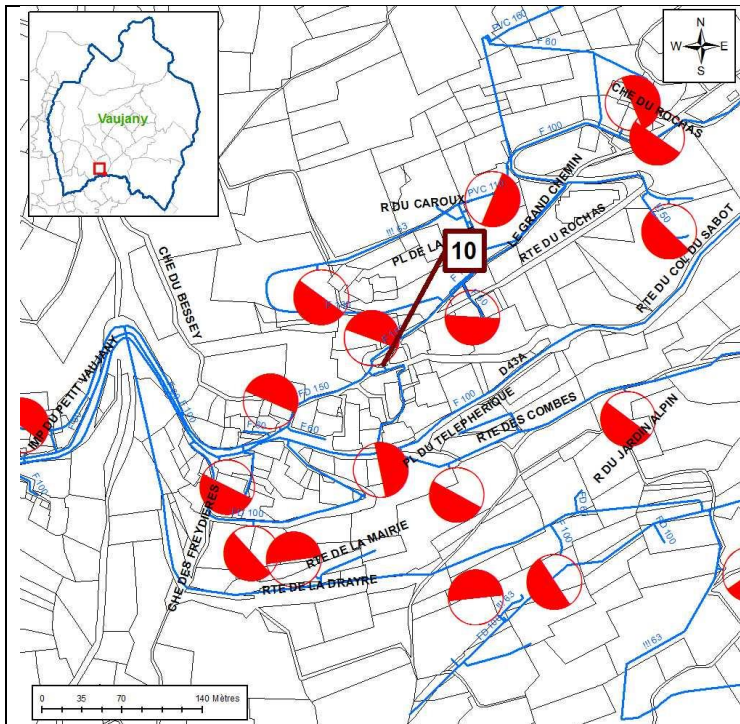

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 11

Adresse : VAUJANY

Face au Restaurant La Table de la Fare


RGF93 X : 941856,5 Y : 6455623,5 Lat. : 45,15747 Long : 6,0787

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	23/10/2020 13 :50		
Pression statique	7,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	158		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	6,7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

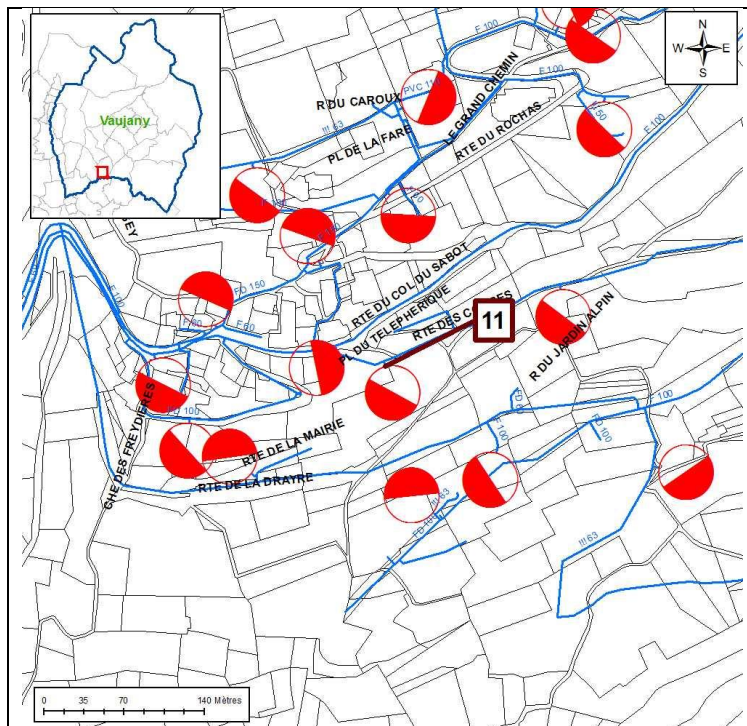

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	2 capots à changer HS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 12

Adresse : VAUJANY

Garderie devant le Bat Pôle Enfance

RGF93 X : 941950,7 Y : 6455547,2

Lat. : 45,15675 Long : 6,07986


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	23/10/2020 14 :10		
Pression statique	12,7		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	95		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	7,9		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

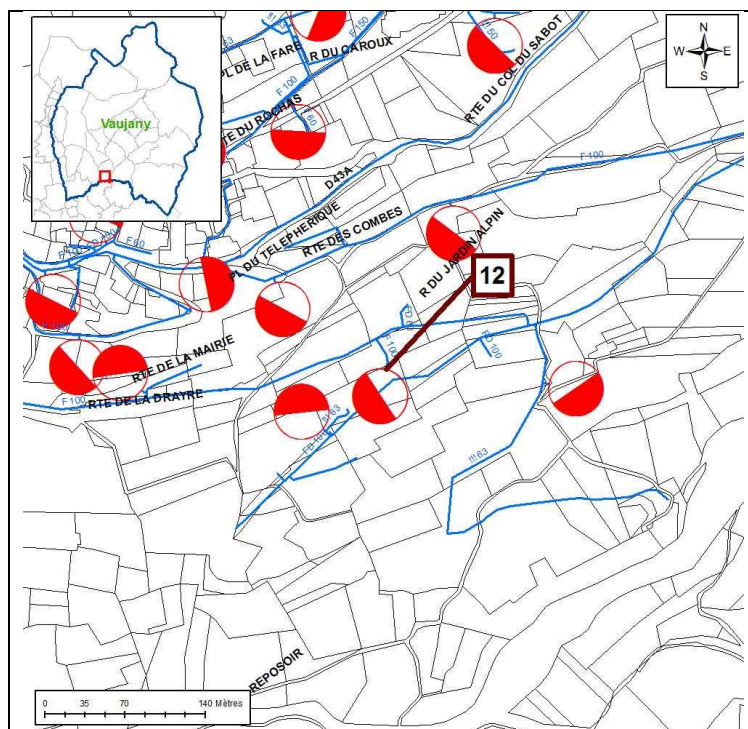

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 13

Adresse : VAUJANY

Face à l'Hôtel des Cimes

RGF93 X : 941705,7 Y : 6455657,7


Lat. : 45,15783 Long : 6,0768

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	23/10/2020 14 :23		
Pression statique	6,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	139		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	2,8		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

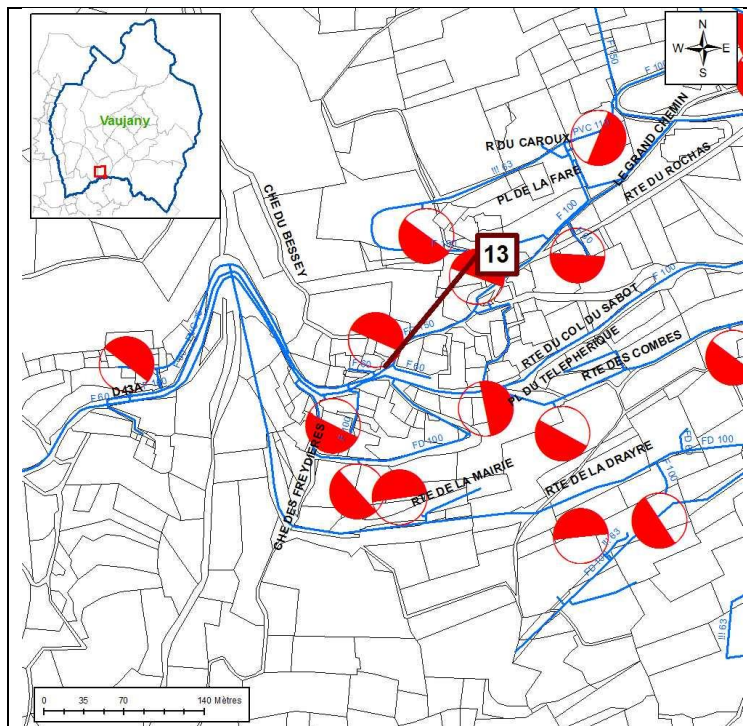

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 14

Adresse : VAUJANY

Dans le Virage

RGF93 X : 941652,6 Y : 6455628,9

Lat. : 45,15759 Long : 6,07611


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	23/10/2020 14 :35		
Pression statique	8,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	152		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	6,2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant
 Raccords dissymétriques DN 100 hors service à changer

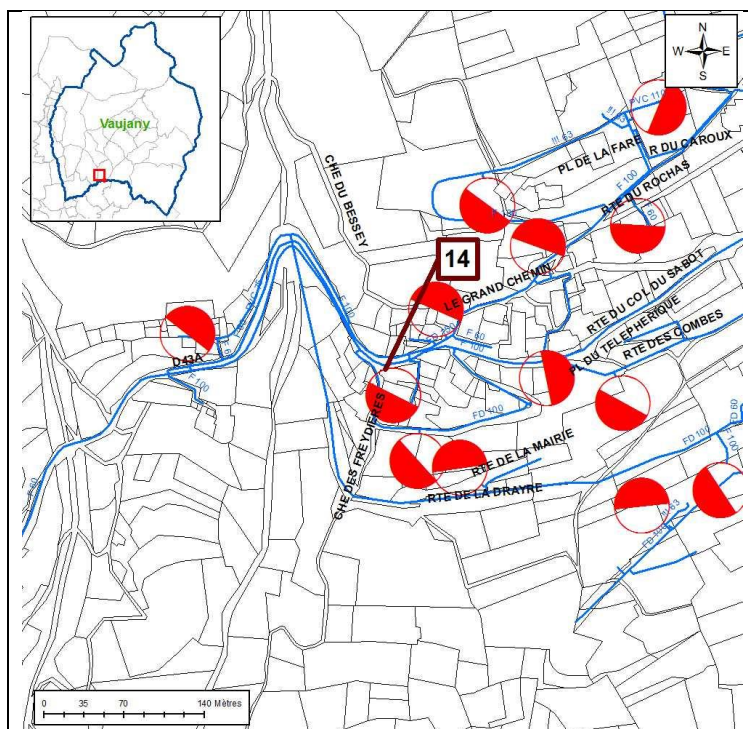

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Bouche de prise en 100 à changer + numérotation à réaliser sur hydrant.,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 15

Adresse : VAUJANY

Face au N°22 à Côté du Chalet Noisette

RGF93 X : 941682,3 Y : 6455573,4

Lat. : 45,15708 Long : 6,07646


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	23/10/2020 14 :43		
Pression statique	9,6		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	160		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	7,5		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

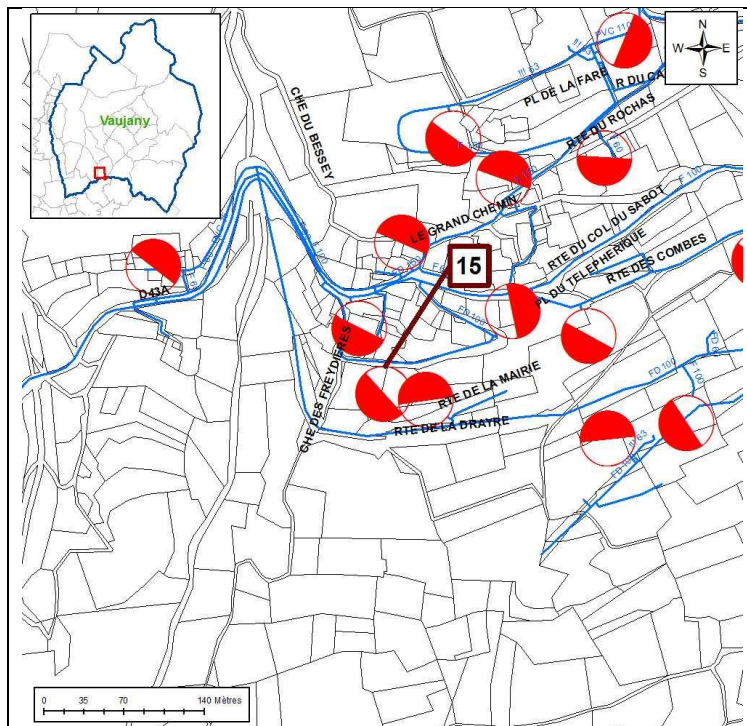

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 16

Adresse : VAUJANY

Face à la Mairie - Accès Route des Combes

RGF93 X : 941779,5 Y : 6455600,5

Lat. : 45,15729 Long :
6,07771

Caractéristiques :

Nature :	Poteau d'incendie
Marque / Modèle :	Bayard / Emeraude
Diamètre :	100
Date pose :	01/01/2013
Diamètre/Nature canalisation :	100 / Fonte

Mesures

23/10/2020
14 :50

Pression statique

9

Débit mesuré en m3/h
sous 1 bar

142

Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m³/h

6,7


Débit requis

Non

En service

Oui

Travaux à réaliser : 0

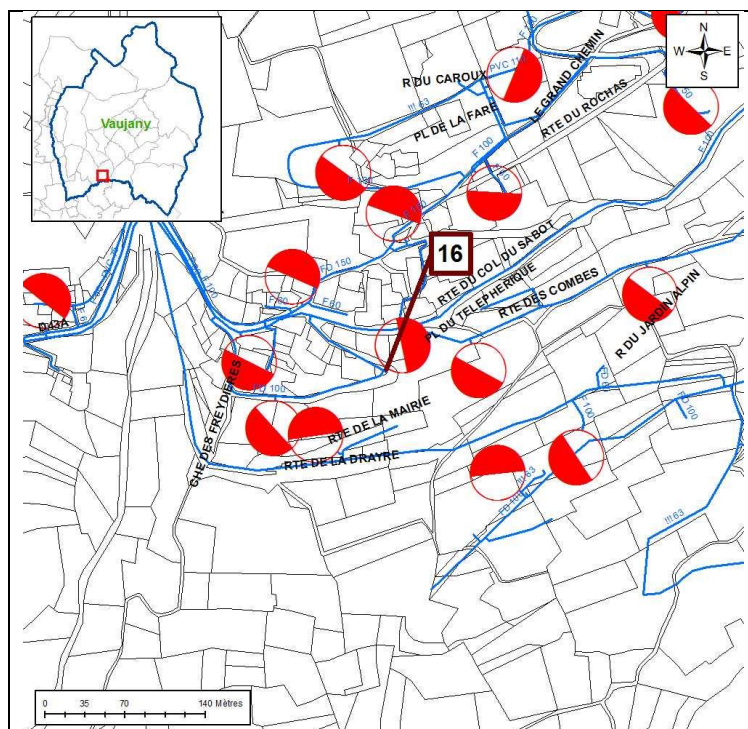

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 17

Adresse : VAUJANY

Carrefour Route de la Drayre

RGF93 X : 941680,6 Y : 6455514,4


Lat. : 45,15655 Long : 6,07641

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	23/10/2020 14 :57		
Pression statique	11,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	110		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	7,3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

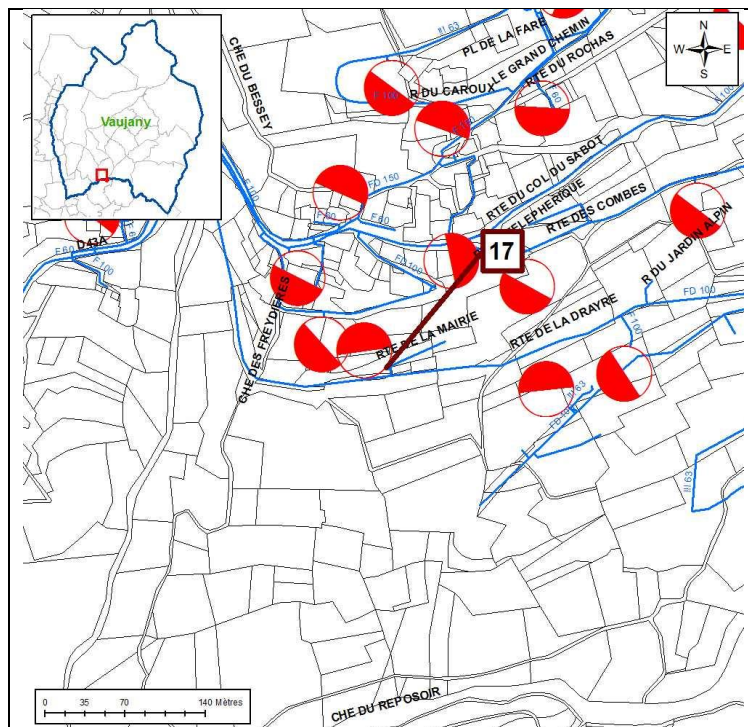

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 18

Adresse : VAUJANY

Face à la Piscine

RGF93 X : 941896 Y : 6455497,3

Lat. : 45,15632 Long : 6,07914


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	23/10/2020 15 :05		
Pression statique	7,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	102		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	5,6		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

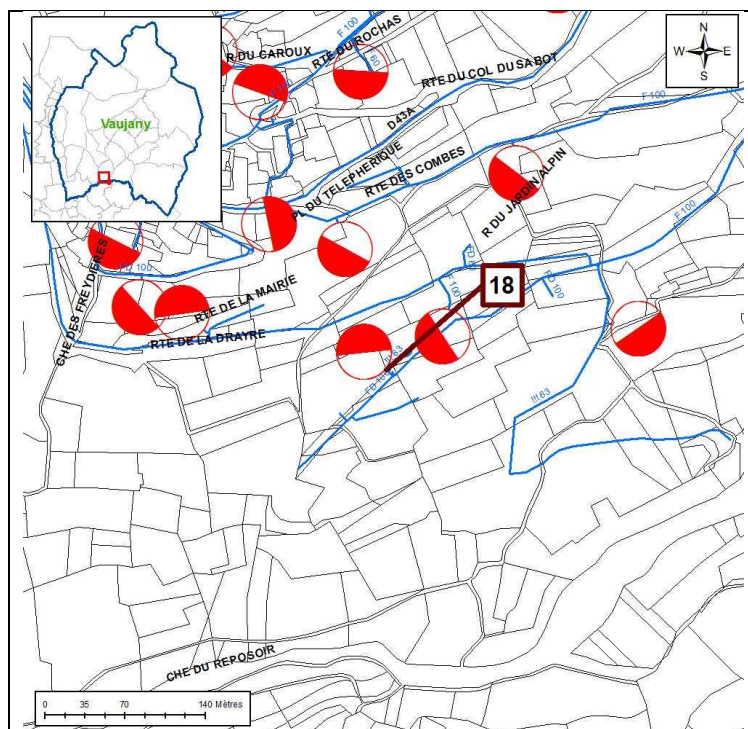

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 19

Adresse : VAUJANY

Face à l'Eglise

RGF93 X : 941487,2 Y : 6455635,8


Lat. : 45,15771 Long : 6,07401

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	23/10/2020 15 :17		
Pression statique	10		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	75		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	3,3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Fuite sur nez de poteau (entre fut et nez)

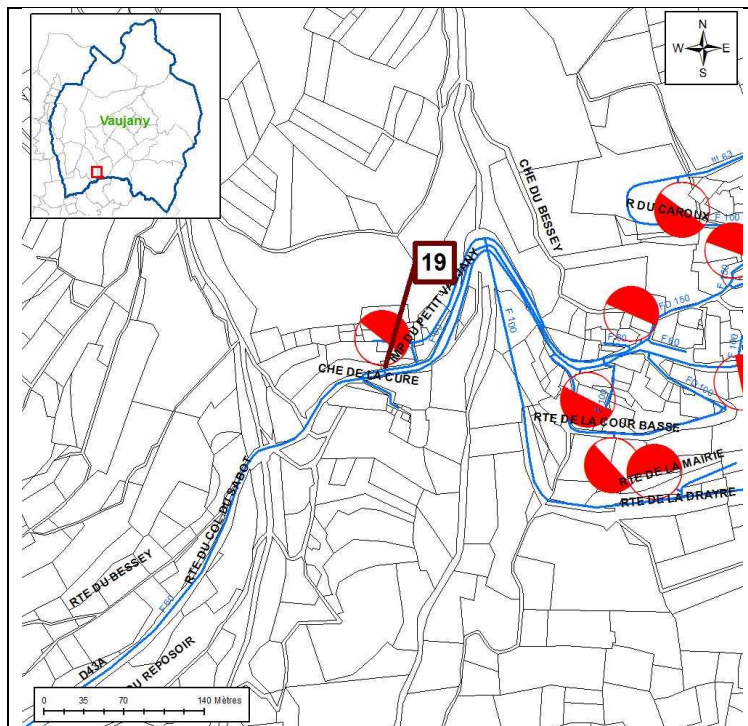

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
23/10/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Fuite sur joint nez de poteau entre fut et nez,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 20

Adresse : VAUJANY

Le Perrier Ancien Réservoir Angle Chemin du Cret


RGF93 X : 940678,1 Y : 6454984,2 Lat. : 45,15213 Long : 6,0634

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures	02/11/2020 09 :17		
Pression statique	3,4		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	101		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	2,5		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

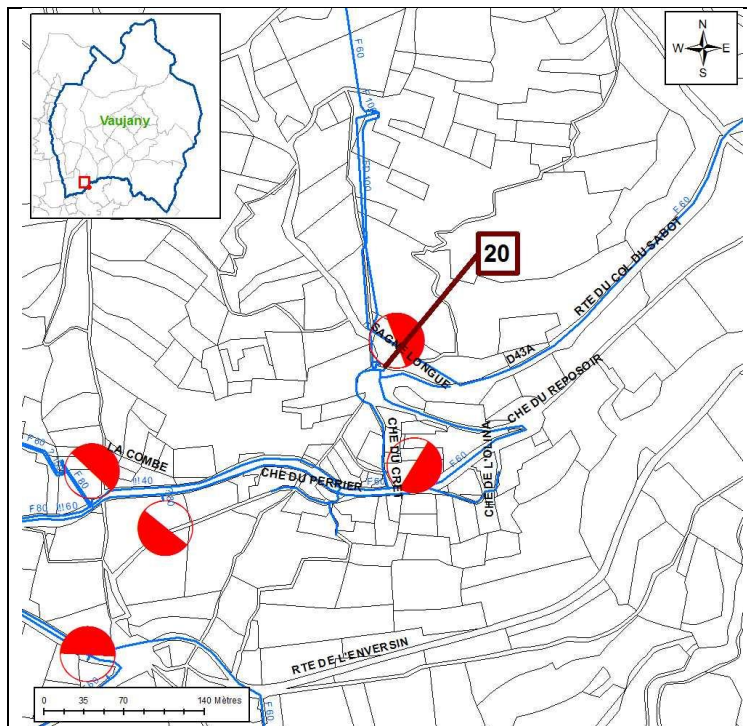

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 21

Adresse : VAUJANY

Le Perrier (Dans escalier) N°289 Rte Col du Sabot


RGF93 X : 940684,8 Y : 6454892,2 Lat. : 45,1513 Long : 6,06344

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Travaux à réaliser : 0

Mesures	02/11/2020 15 :20		
Pression statique	6,1		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	110		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	4,7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

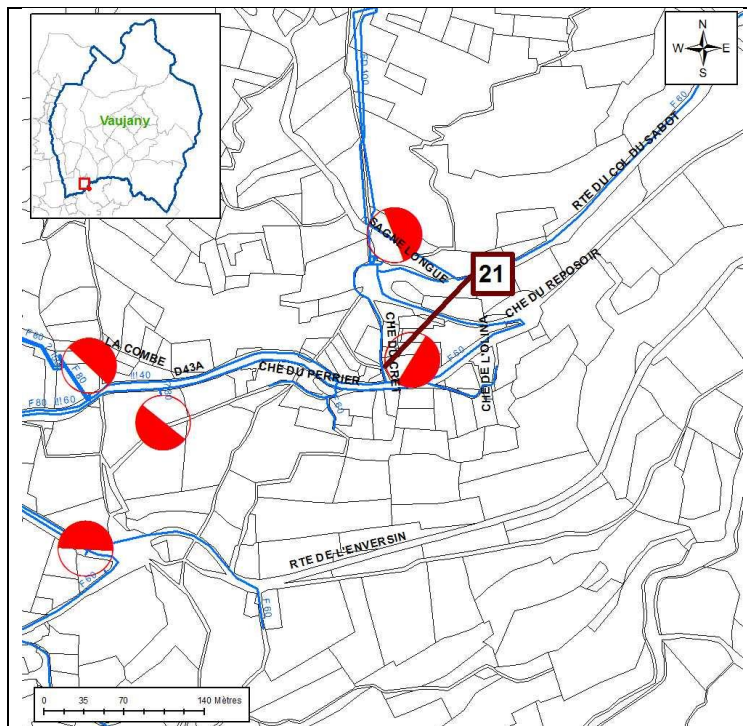

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 22

Adresse : VAUJANY

Le Perrier

RGF93 X : 940435,4 Y : 6454874,7

Lat. : 45,15123 Long : 6,06026


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 80 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 09 :29		
Pression statique	2,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	115		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	1,8		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

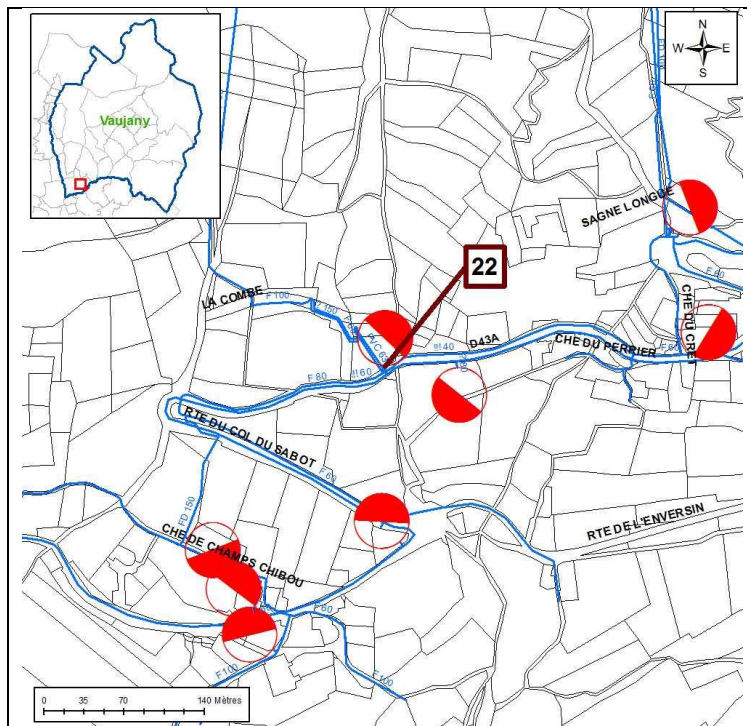

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Capot sans serrure à remplacer,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 23

Adresse : VAUJANY

Pourchery Chapelle St Claude

RGF93 X : 940444 Y : 6454713,9

Lat. : 45,14978 Long : 6,06029


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 09 :41		
Pression statique	6,8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	24		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

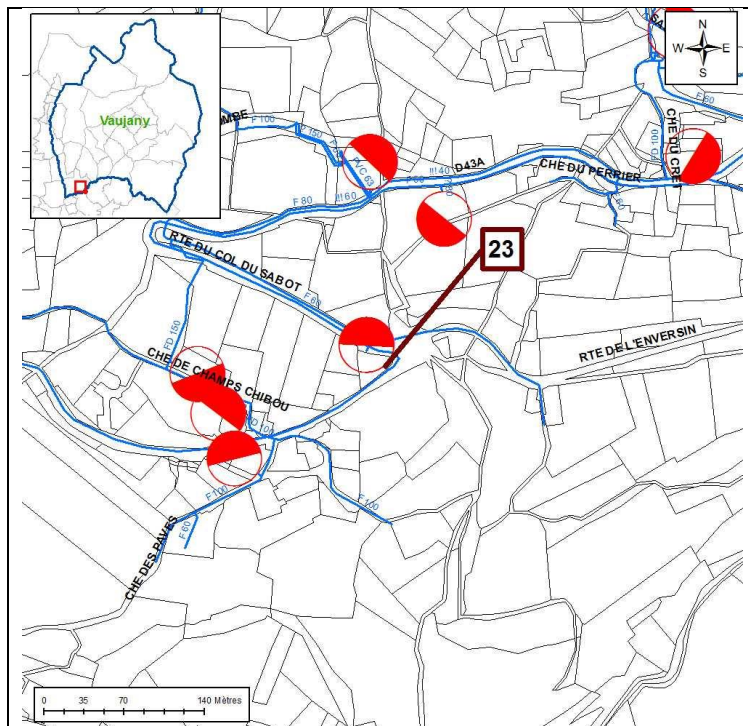

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 24

Adresse : VAUJANY

Pourchery Chemin Accès à l'Auberge du Lac

RGF93 X : 940298 Y : 6454647,1

Lat. : 45,14923 Long : 6,0584


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 09 :54		
Pression statique	8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	24		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

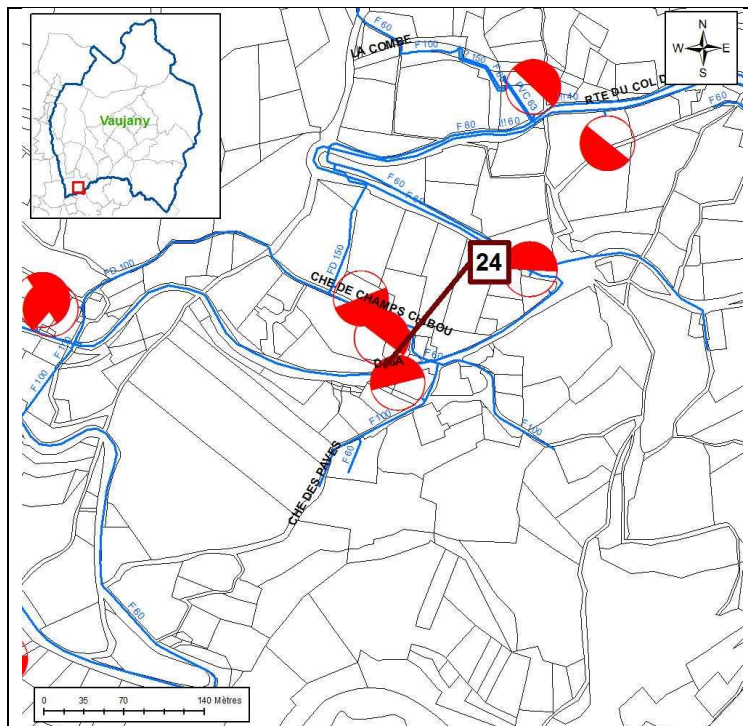

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 25

Adresse : VAUJANY

Pourchery Direction Terrain de Basket

RGF93 X: 940254,3 Y: 6454717,7

Lat: 45,14988 Long: 6,05788

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie

Marque / Modèle : Bayard / Emeraude

Diamètre : 100

Date pose : 01/01/2013

Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

02/11/2020
15 :01

Pression statique

5

Débit mesuré en m3/h
sous 1 bar

92

Pression dynamique en
bar au débit mesuré de
60m3/h

1,7


Débit requis

Oui

En service

Oui

Travaux à réaliser : 0

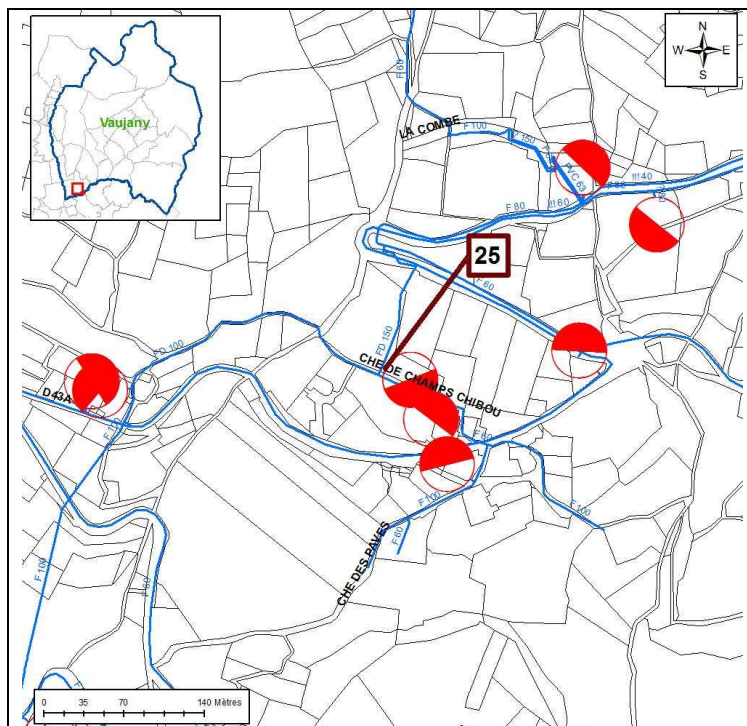

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 26

Adresse : VAUJANY

Condamine Angle Route accès au Hameau

RGF93 X : 939994,6 Y : 6454682

Lat. : 45,14965 Long : 6,05456


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 10 :40		
Pression statique	5,3		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	23		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

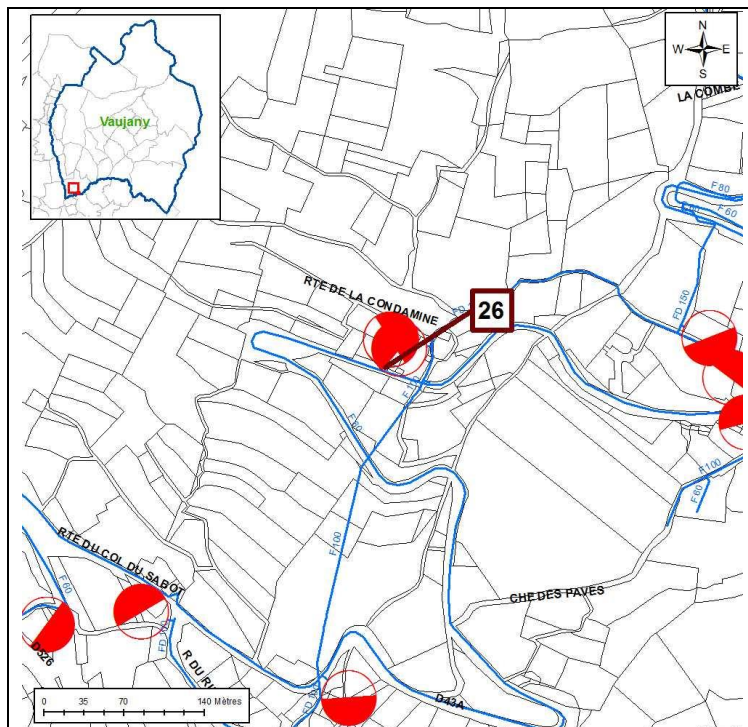

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	2 capots à changer HS + débit requis : NON,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 27

Adresse : VAUJANY

Rte du Hameau au bout de la Rte des Escaliers

RGF93 X : 940029,3 Y : 6454700

Lat. : 45,1498 Long : 6,05501


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 11 :02		
Pression statique	7,7		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	100		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	2,9		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

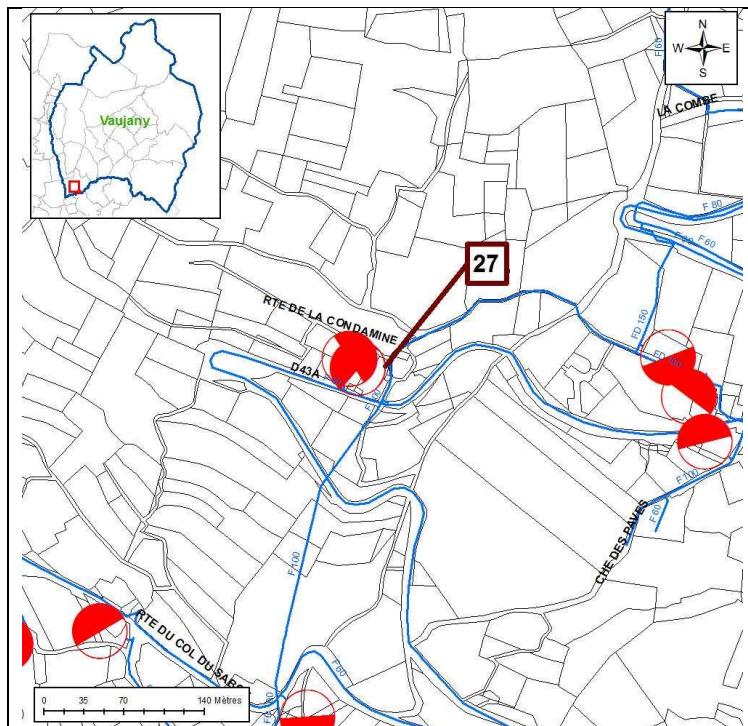

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 28

Adresse : VAUJANY

Rif Jany Angle de Rue

RGF93 X : 939942,2 Y : 6454409,9

Lat. : 45,14722 Long : 6,05376


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 11 :17		
Pression statique	4,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	24		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

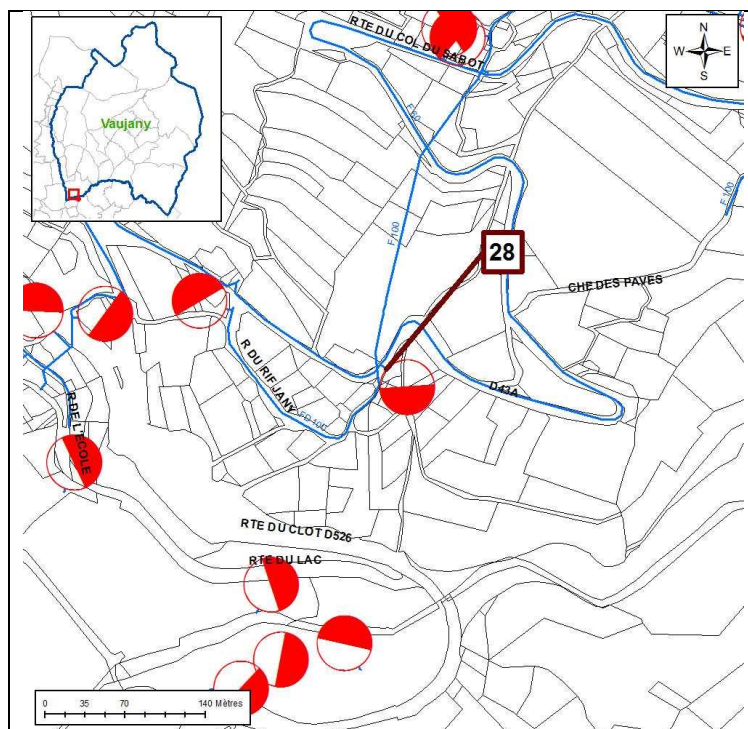

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 29

Adresse : VAUJANY

Rif Jany Début de la Rue - Accès Parking Bus

RGF93 X : 939803,6 Y : 6454454,6

Lat. : 45,14767 Long : 6,05202


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/2013
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 12 :02		
Pression statique	6,3		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	108		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	4,8		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

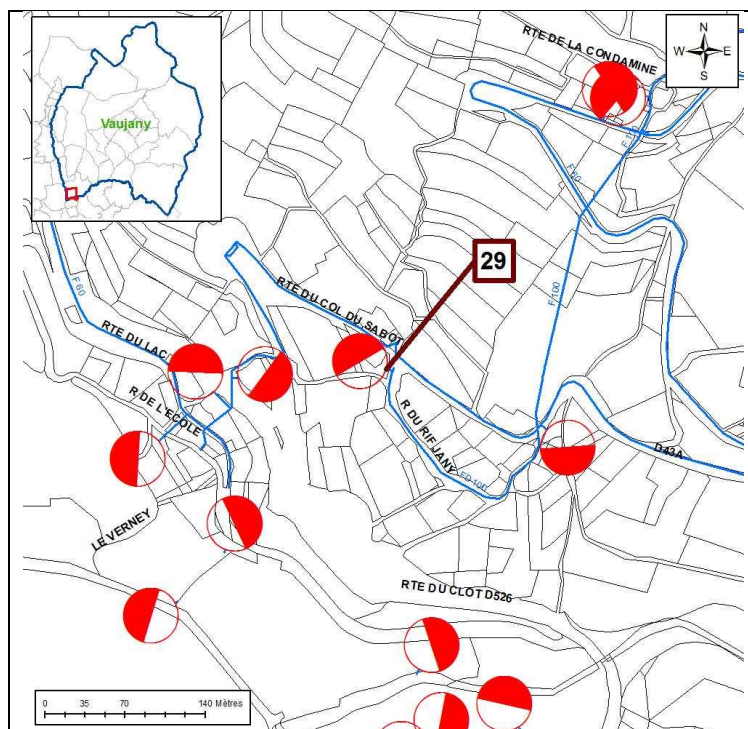

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 30

Adresse : VAUJANY

Le Verney - Proche Abris Bus

RGF93 X : 939672,3 Y : 6454455,1

Lat. : 45,14772 Long :
6,05035

Caractéristiques :


Nature :	Poteau d'incendie
Marque / Modèle :	Bayard / Emeraude
Diamètre :	100
Date pose :	
Diamètre/Nature canalisation :	60 / Fonte

Mesures

02/11/2020
14:08

Pression statique	4,4		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	25		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

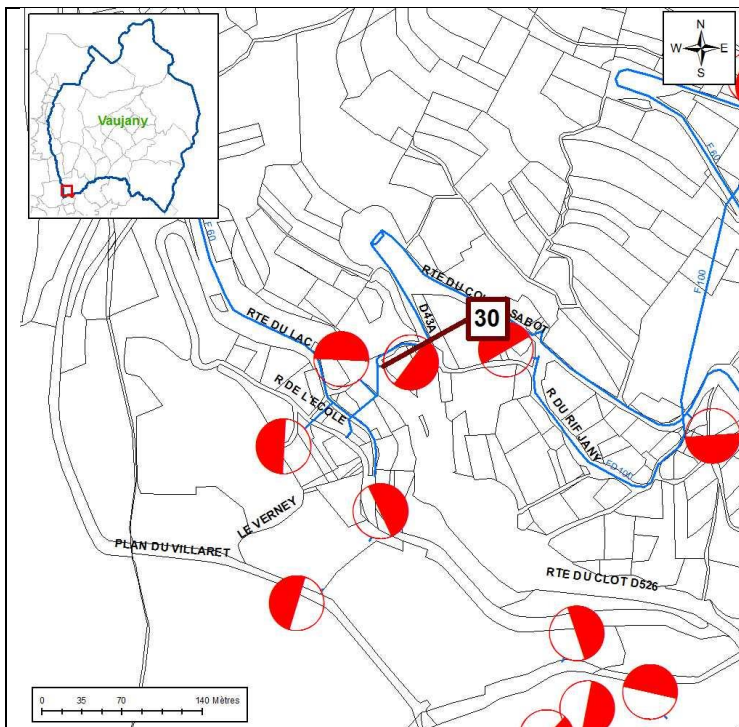

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	2 capots HS + débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 31

Adresse : VAUJANY

Le Verney Cité EDF à côté du Transfo

RGF93 X : 939599 Y : 6454396,7


Lat. : 45,14722 Long : 6,04939

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures	02/11/2020 15 :24		
Pression statique	7,6		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	90		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	4,4		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

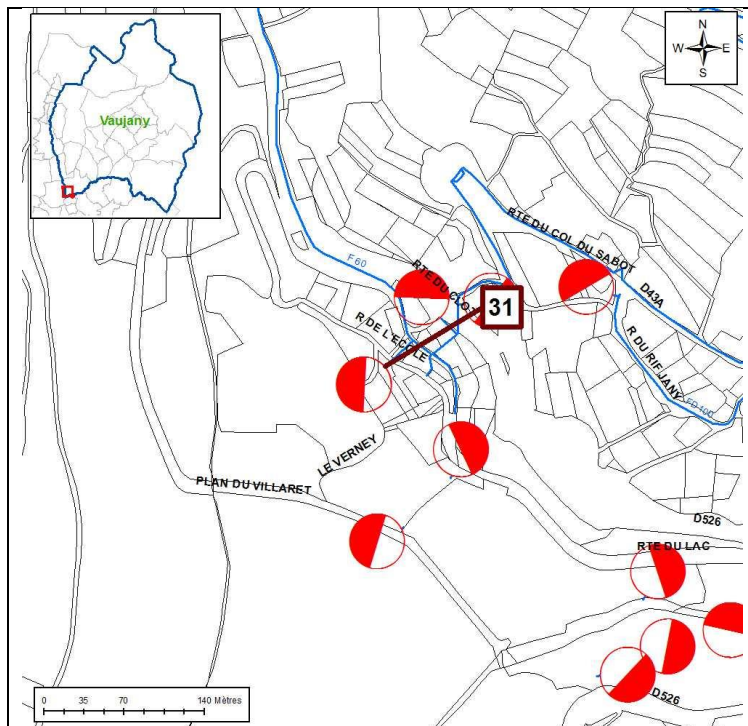

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 32

Adresse : VAUJANY

Le Perrier Parking Chalet Maitreray Face au N°289

RGF93 X : 940643,1 Y : 6454873,9 Lat. : 45,15115 Long : 6,0629


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 80
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 80 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 11 :09		
Pression statique	7,3		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	52		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

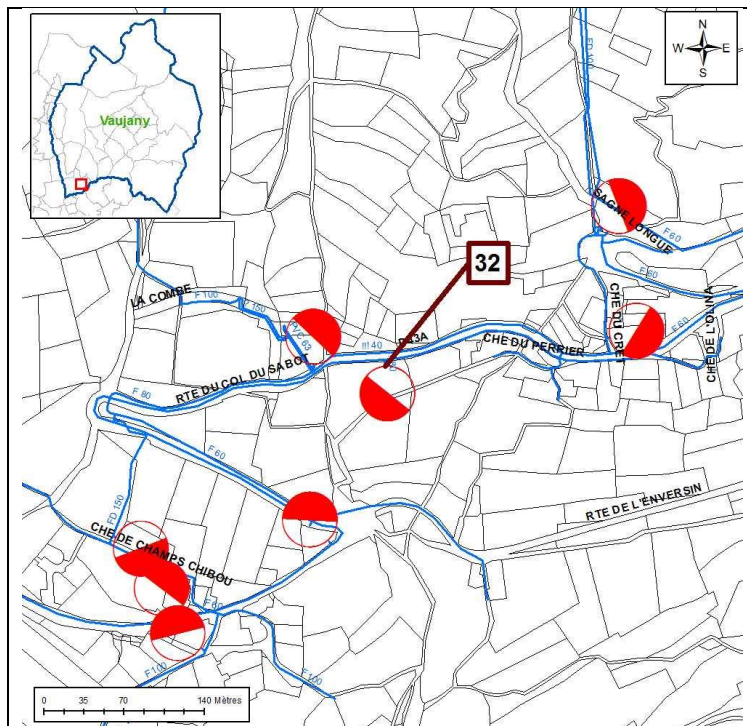

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	RAS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 33

Adresse : VAUJANY

Rondpoint Rte des Combes et Rte de la Drayre

RGF93 X : 942092,7 Y : 6455533,8

Lat. : 45,15658 Long : 6,08166


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 10 :16		
Pression statique	8		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	134		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	6,8		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

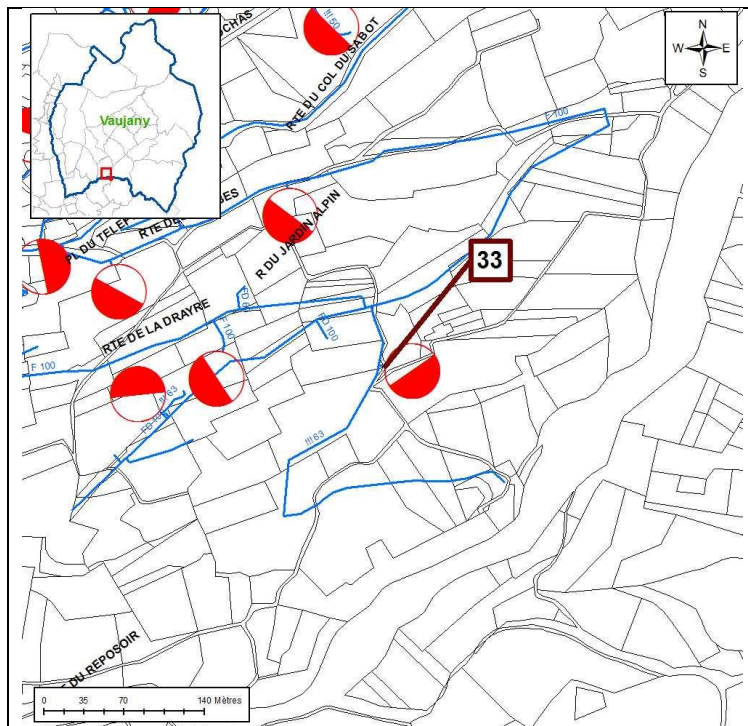

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 39

Adresse : VAUJANY

Verney Chemin qui rejoint la Rue de l'Ecole

RGF93 X : 939652,3 Y : 6454442,1

Lat. : 45,14761 Long : 6,05009


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 80
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	02/11/2020 16 :28		
Pression statique	6,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	15		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

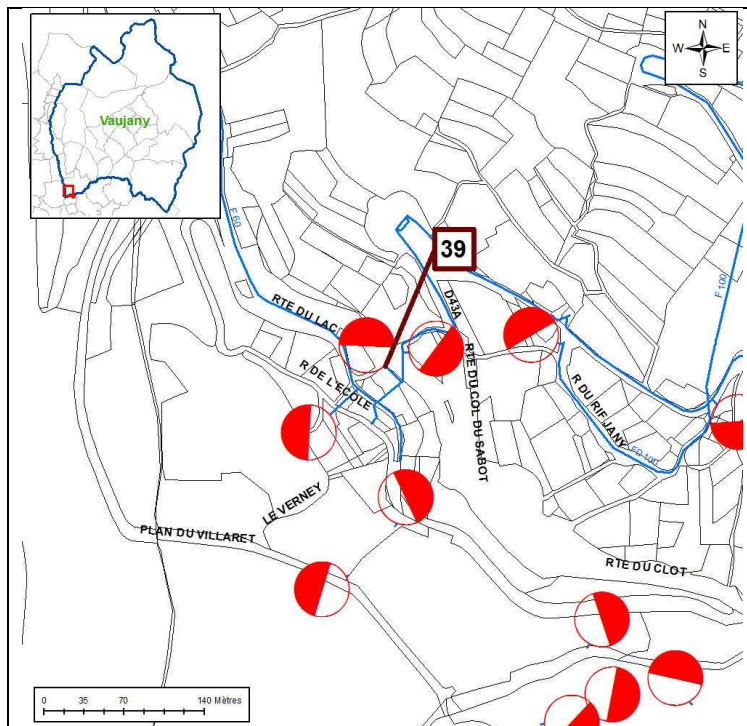

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
02/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant + débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 40

Adresse : VAUJANY

Le Rochas

RGF93 X : 942030,7 Y : 6455934,9

Lat. : 45,16021 Long : 6,08107


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 80
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 60 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 09 :52		
Pression statique	3,3		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	14		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

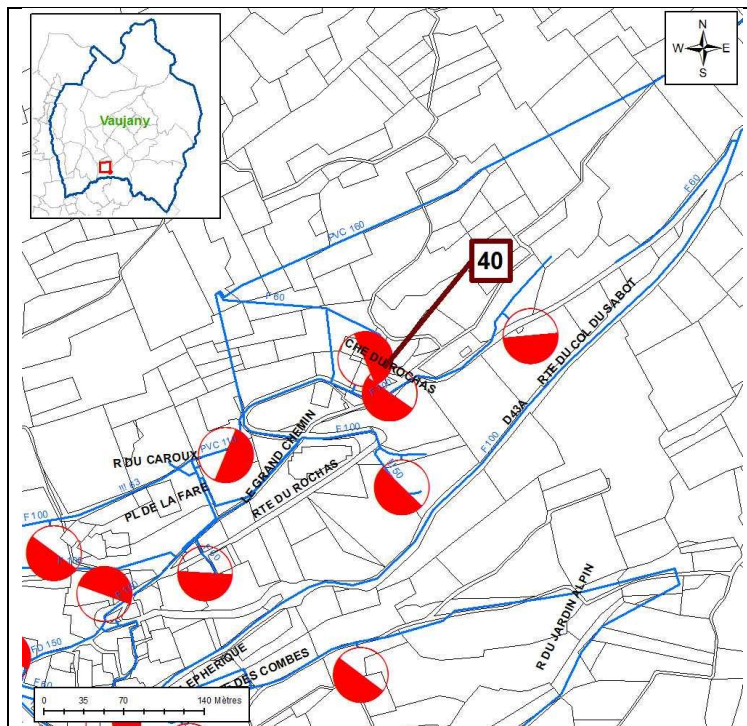

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant + débit requis : NON

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 41

Adresse : VAUJANY

Hameau Le Rochas Centre Technique Communal

RGF93 X : 942139,1 Y : 6455976,9

Lat. : 45,16055 Long : 6,08247


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Saphir
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 09 :41		
Pression statique	3,9		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	80		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	1,8		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

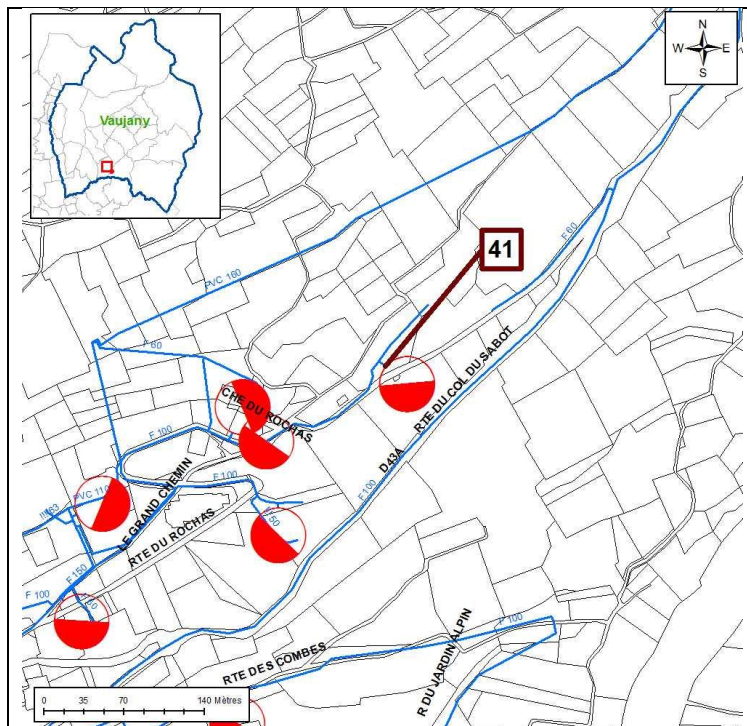

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 42

Adresse : VAUJANY

La Villette Accès au N°641

RGF93 X : 942653,5 Y : 6456556,1 Lat. : 45,16558 Long : 6,0893


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	03/11/2020 11 :25		
Pression statique	5,5		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	84		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	2,9		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

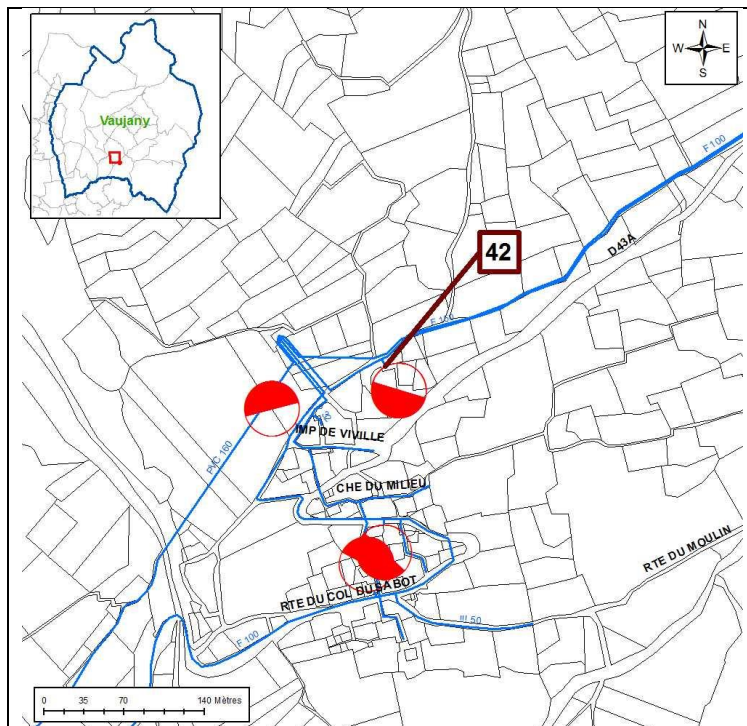

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
03/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° PI 43

Adresse : VAUJANY

Devant la Résidence Les Epinettes

RGF93 X : 941962 Y : 6455679,9

Lat. : 45,15794 Long : 6,08007


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 10 :04		
Pression statique	8,7		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	133		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	6,7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

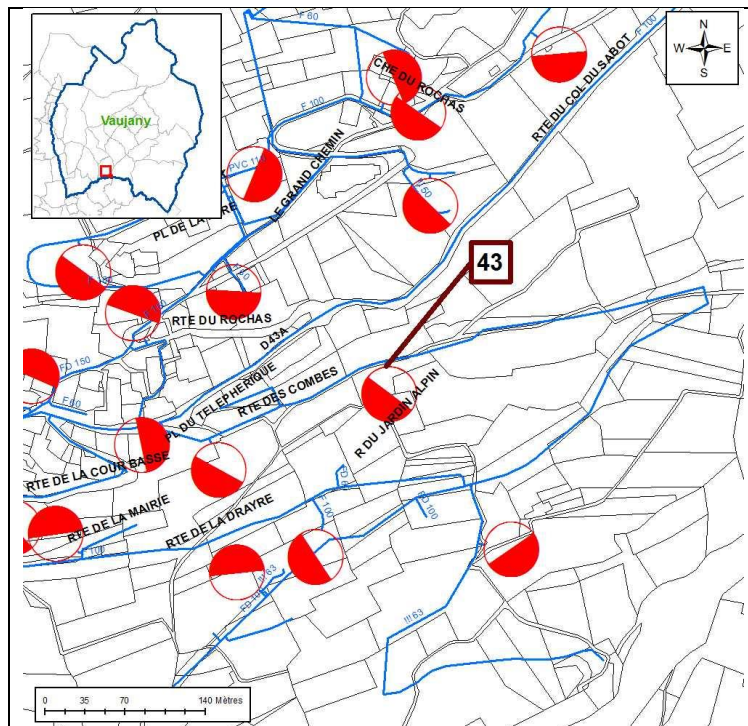

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° PI 44

Adresse : VAUJANY

Au Pied du Chemin des Pavés

RGF93 X : 940343,7 Y : 6454624,4

Lat. : 45,14901 Long : 6,05897


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 100 / Fonte

Mesures

	04/11/2020 11 :21		
Pression statique	6,2		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	64		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0,2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

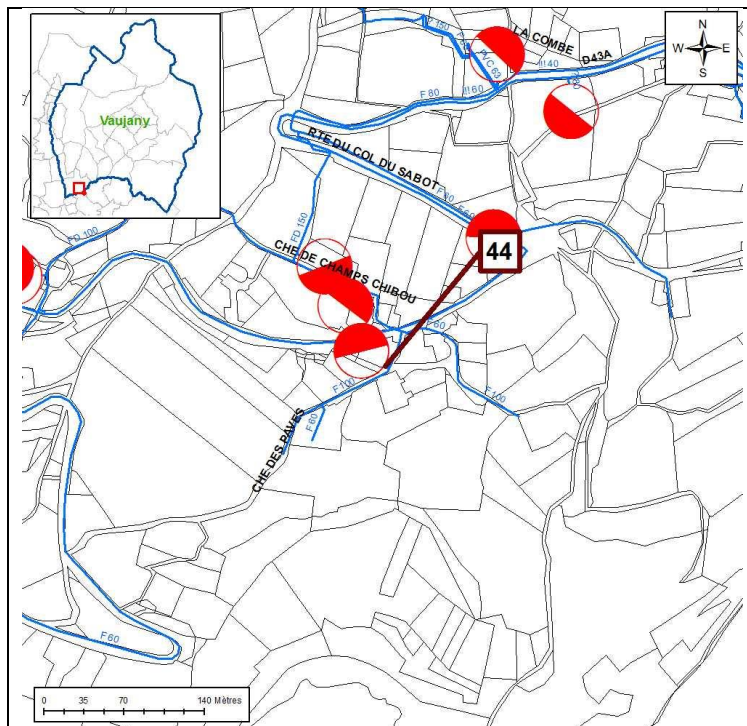

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
04/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Numérotation à réaliser sur hydrant

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 46

Adresse : VAUJANY

Montfrais

RGF93 X : 943528,7 Y : 6456174,7

Lat. : 45,16184 Long : 6,10024


Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 110 / Pvc

Mesures

	03/11/2020 10 :46		
Pression statique	9,5		
Débit mesuré en m3/h sous 1 bar	21		
Pression dynamique en bar au débit mesuré de 60m3/h	0		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : 0

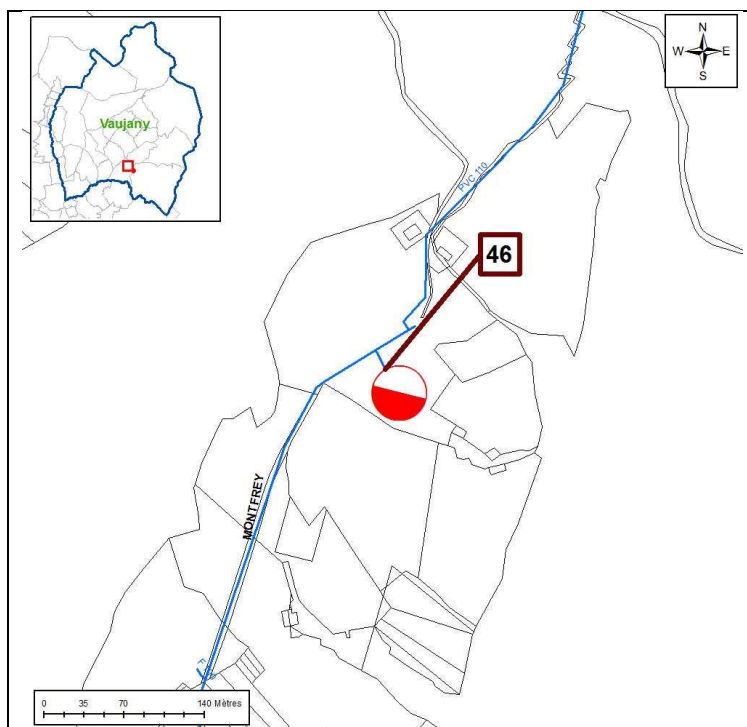

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
03/11/2020	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression	Débit requis : NON

Travaux à effectuer sur LES HYDRANTS

N° / Diamètre / Adresse	Marque	Modèle	Travaux à effectuer
N°1 / 100 / Parking du Collet	Bayard	Emeraude	Coffres à changer / 2 Capots
N°2 / 100 / La Villette Fond de l'Impasse	Bayard	Emeraude	Etanchéité de la tête à reprendre
N°4 / 100 / La Villette	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°6 / 100 / Entrée de l'Immeuble	Bayard	Emeraude	Refaire peinture
N°7 / 100 / A droite des WC Public	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°8 / 100 / Derrière le N°16 en Direction de la Place Fare	Bayard	Emeraude	Joint de bouchon de 65 à changer
N°11 / 100 / Face au Restaurant La TABLE de la FARE	Bayard	Emeraude	Coffres à changer / 2 Capots
N°14 / 100 / Dans le Virage	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant Raccords dissymétriques hors service à changer
N°15 / 100 / Face au N°22 a Coté du Chalet Noisette	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°18 / 100 / Face à la Piscine	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°19 / 100 / Face à l'Eglise	Bayard	Emeraude	Fuite sur nez de poteau (entre fut et nez)
N°22 / 100 / Le Perrier	Bayard	Emeraude	Capot / Coffre à changer coté sans serrure
N°26 / 100 / Condamine Angle Route accès au Hameau	Bayard	Emeraude	Coffres à changer / 2 Capots
N°30 / 100 / Le Verney - Proche Abris Bus	Bayard	Emeraude	Coffres à changer / 2 Capots
N°33 / 100 / Rondpoint rte des combes / Route de la Drayre	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°39 / 80 / Verney Chemin qui rejoint la Rue de l'Ecole	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N° 40 / 80 / Le Rochas	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°41 / 100 / Hameau Le Rochas Centre Technique Communal	Bayard	Saphir	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°42 / 100 / La Villette Accès au N°641	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°43 / 100 / Devant la Résidence Les Epinettes	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
N°44 / 100 / Au Pied du Chemin des Pavés	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
